



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 125 -2025-DIGA-UNSCH

Ayacucho, 26 de febrero del 2025

VISTOS:

El Informe N° 429-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, del Ing. Mauricio Zamora Huamán Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones quien solicita la aprobación bajo Acto Resolutivo el programación de ejecución del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32° de La Directiva N° 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, señala "la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N° 667-2024-UNSCH-R, **se aprueba el COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** con CUI: N°2644228;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, Rectifican el error material contenido en la **Primera Disposición Complementaria Final** de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: "8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, Primera. - Vigencia La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva";

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que, mediante Resolución Rectoral N° 655-2024-UNSCH-R, se aprueba la ejecución del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, por un monto total neto de S/ 7,636.339.72 (Siete Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Trecientos Treinta y Nueve Con 72/100), bajo la modalidad de administración directa, con un periodo de ejecución de 180 días calendarios;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2024, se firma el acta de INICIO DE EJECUCIÓN del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, con fecha 31 de diciembre del 2024, se firma el acta de SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, mediante Resolución Directoral N°016-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 22 de enero de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N°02 - 2025 de COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, por el importe de Dos Millones Cien Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 77/100 soles (S/. 2,100,494.77), con plazo de ejecución de 90 días calendarios;

Que, con fecha 22 de enero del 2025, se firma el acta de REINICIO DE EJECUCIÓN del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, mediante Carta N° 014-2025-UEI-UNSCH/JTP-RO, de fecha 28 de enero de 2025, con atención al supervisor de obra, el residente de obra Ing. Julian Tanta Pablo, presenta el cronograma de ejecución valorizado del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, para su evaluación y aprobación; ello, bajo el sustento técnico citado en el documento;

Que, mediante Carta N° 007-2025-UNSCH-UEI-META64/REB-SO, de fecha 31 de enero de 2025, con atención al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el supervisor de obra Ing. Rocky Escobar Bellido, tras evaluación de los cronogramas remitidos mediante CARTA N° 014-2025-UEI-UNSCH/JTP-RO, remite el informe favorable para la aprobación bajo acto resolutivo el cronograma de ejecución de obra valorizado N° 02 y el cronograma de ejecución de obra (Diagrama Gantt);

*Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que, mediante la Carta Múltiple N° 007-2025-UNSCH-UEI/MZH, de fecha 07 de febrero de 2025, con atención al supervisor y residente de obra, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, remite observaciones para su absolución correspondiente a la solicitud de aprobación de cronograma valorizado de ejecución del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2644228;

Que, mediante Carta N° 027-2025-UEI-UNSCH/JTP-RO, con atención al supervisor de obra, el residente de obra Ing. Julian Tanta Pablo, remite la subsanación de observaciones al cronograma de ejecución valorizado según el plazo de la habilitación presupuestal para el COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, mediante Carta N° 013-2025-UNSCH-UEI-META64/REB-SO, de fecha 12 de febrero de 2025, con atención al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el supervisor de obra Ing. Rocky Escobar Bellido, remite informe de aprobación del cronograma de ejecución de obra valorizado, del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO";

Que, mediante la Carta N° 013-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, de fecha 20 de febrero de 2025, con atención al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el Especialista II en Proyectos de Inversión de la UEI remite el Informe N° 013-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, en el cual se evalúa el cronograma de ejecución de obra valorizado conforme a la habitación presupuestal - Analítico N° 02-2025 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2644228, y en cuyo informe, concluye procedente para la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N° 429 - 2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 21 de febrero del 2025, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en conformidad con el informe técnico remitido por el supervisor de obra y la evaluación de la especialista II en proyectos de Inversión, solicita la aprobación mediante acto resolutivo el cronograma de ejecución de obra valorizado conforme al plazo de habilitación presupuestal - Analítico N° 02 -2025 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI: N°2644228, por el importe de dos millones cien mil cuatrocientos noventa y cuatro con 77/100 soles (S/. 2,100,494.77);

Que, el párrafo sexto del literal 7.3.7 de la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMP - "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", establece que Luego de Reiniciados los trabajos, el residente de obra presentará a la OAD de la entidad dentro de los dos (2) días calendario siguientes, el cronograma de obra actualizado con las firmas correspondientes de los responsables técnicos consignando la nueva fecha de conclusión para efectuar el trámite correspondiente para la emisión del acto resolutivo por parte de la entidad;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documento precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSCH-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de calendario del avance de obras directa e indirecta y calendario de adquisición de mano de obra, materiales y equipos de obras directa e indirecta;

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Directiva N° 017-2023-CG/GMPL; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Programa de ejecución (Diagrama Gantt), Cronograma de avance de ejecución valorizado, Calendario de utilización de mano de obra calificada y no calificada, Calendario de utilización de equipos y maquinarias y Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", correspondientes al plazo de ejecución de (90) días calendarios asignadas en la habilitación presupuestal – N° 02-2025, cuantificadas a partir del 22.01.2025 al 21.04.2025, según se detalla en el Anexo N° 01 (Diagrama de Gantt) y conforme al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN VALORIZADO

N°	Mes	PERIODO		AVANCE PROGRAMADO			
		Del - Al	N° de días	Monto valorizado con IGV (costo Directo)	Monto acumulado con IGV (costo directo)	% del mes	% acumulado
0	INICIO						
1	Ene-25	22 al 31/01/2025	10	53,643.54	53,643.54	2.79	2.79
2	Feb-25	01 al 28/02/2025	28	618,257.62	671,901.16	32.10	34.88
3	Mar-25	01 al 31/03/2025	31	688,348.53	1,360,249.69	35.74	70.62
4	Abr-25	01 al 21/04/2025	21	565,895.27	1,926,144.97	29.38	100.00
TOTAL INC.IGV			90	1,926,144.97			

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES O INSUMOS

N°	Mes	PERIODO		AVANCE PROGRAMADO			
		Del - Al	N° de días	Monto valorizado con IGV	Monto acumulado con IGV	% del mes	% acumulado
0	INICIO						
1	Ene-25	22 al 31/01/2025	10	0.00	53,285.05	5.78	5.78
2	Feb-25	01 al 28/02/2025	28	156,286.96	209,572.01	16.95	22.73
3	Mar-25	01 al 31/03/2025	31	346,261.20	555,833.21	37.56	60.29
4	Abr-25	01 al 21/04/2025	21	366,116.90	921,980.11	39.71	100.00
TOTAL INC.IGV			90	1'261,685.21			

CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

N°	Mes	PERIODO		AVANCE PROGRAMADO			
		Del - Al	N° de días	Monto valorizado con IGV	Monto acumulado con IGV	% del mes	% acumulado
0	INICIO						
1	Ene-25	22 al 31/01/2025	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Feb-25	01 al 28/02/2025	28	1,705.95	1,705.95	5.80	5.80
3	Mar-25	01 al 31/03/2025	31	27,700.00	29,405.95	94.20	100.00
4	Abr-25	01 al 21/04/2025	21	0.00	29,405.95	0.00	100.00
TOTAL INC.IGV			90	29,405.95			

CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

N°	Mes	PERIODO		AVANCE PROGRAMADO			
		Del - Al	N° de días	Monto valorizado con IGV	Monto acumulado con IGV	% del mes	% acumulado
0	INICIO						
1	Ene-25	22 al 31/01/2025	10	50,411.57	24,623.35	12.45	12.45
2	Feb-25	01 al 28/02/2025	28	108,973.00	81,992.43	26.91	39.36
3	Mar-25	01 al 31/03/2025	31	95,014.00	276,319.41	23.46	62.82
4	Abr-25	01 al 21/04/2025	21	150,578.26	430,109.42	37.18	100.00
TOTAL INC.IGV			90	404,976.83			

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presenta acto resolutivo, conforme a ley.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFIQUESE, la presente Resolución Directoral a los correos siguientes: escobar_10b@hotmail.com y tantajulian@gmail.com, establecidas para fines de notificación entre las partes; así como a las áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 4°.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Juan de Dios Canchari Gasto
DIRECTOR

DISTRIBUCION
RECTORADO;
OCI; OPP; UP;
UEI; UA;
Contabilidad;
Tesorería;
Archivo
JDCQ/wat
N° EXP: 2502967

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

Id	Items	Nombre de tarea	Duración	Profesor/Coordinador	Fin	ene '01	ene '21	ene '22	feb '25	mar '25	abr '25	may '25
1	01	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	90 días	mié 22/01/25	lun 21/04/25		22/01		90 días			
2	01.01	INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR ADECUADA	90 días	mié 22/01/25	lun 21/04/25		22/01		90 días			
3	01.01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	90 días	mié 22/01/25	lun 21/04/25		22/01		90 días			
4	01.01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25		22/01	1 día				
5	01.01.01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25		22/01	1 día				
6	01.01.01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25		22/01	1 día				
7	01.01.01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25		22/01	1 día				
8	01.01.01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25		22/01	1 día				
9	01.01.01.03	PLAN DE DESMO	90 días	mié 22/01/25	lun 21/04/25		22/01		90 días			
10	01.01.01.03.01	PLAN DE DESMO	90 días	mié 22/01/25	lun 21/04/25		22/01		90 días			
11	01.01.01.04	CONTROL TOPOGRAFICO EN OBRA	90 días	mié 22/01/25	lun 21/04/25		22/01		90 días			
12	01.01.01.04.01	CONTROL TOPOGRAFICO PERMANENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	90 días	mié 22/01/25	lun 21/04/25		22/01		90 días			
13	01.01.02	PAVIMENTO VEHICULAR Y CICLOVIA REVESTIDO CON ADOQUIN DE CONCRETO	57 días	mié 22/01/25	mié 19/03/25		22/01		57 días			
14	01.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	83 días	mié 22/01/25	dom 23/02/25		22/01		83 días			
15	01.01.02.02.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25		22/01	1 día				
16	01.01.02.02.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A NIVEL DE SUBRASANTE	32 días	mié 22/01/25	dom 23/02/25		22/01		32 días			
17	01.01.02.02.03	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25		22/01	1 día				
18	01.01.02.02.04	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE	5 días	mié 22/01/25	mar 28/01/25		22/01	5 días				
19	01.01.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	3 días	mié 22/01/25	vie 31/01/25		22/01	3 días				
20	01.01.02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	2 días	mié 22/01/25	lun 30/01/25		22/01	2 días				
21	01.01.02.03	CAPA RODADURA DE CALZADA REVESTIDA CON ADOQUIN DE CONCRETO	57 días	mié 22/01/25	mié 19/03/25		22/01		57 días			
22	01.01.02.03.01	BASE GRANULAR E= 0.28 M	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25		22/01	1 día				
23	01.01.02.03.02	PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE BASE	3 días	mié 22/01/25	dom 22/01/25		22/01	3 días				
24	01.01.02.03.03	CAMA DE ARENA E=0.04 M	24 días	24CC+1 día	sáb 03/02/25		22/01	24 días				
25	01.01.02.03.04	REVESTIMIENTO DE PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO 0.10X0.20X0.08	44 días	24CC+3 días	mar 04/02/25		22/01	44 días				

PARALIZACION DE OBRA DEL 01 DE ENERO HASTA 21 DE ENERO

Tarea: Tareas externas

División: Hito externo

Hito: Tarea inactiva

Resumen: Hito inactivo

Resumen del proyecto: Resumen inactivo

Tarea manual: Tarea manual

Sólo duración: Sólo duración

Informe de resumen manual: Informe de resumen manual

Resumen manual: Resumen manual

Sólo el comienzo: Sólo el comienzo

Fecha límite:

Tareas críticas:

División crítica:

Progreso:

Progreso manual:



THE GOVERNMENT OF PERU
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 EFECTIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO B.S. SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS - UNBSM
 Ing. Rocky Escobar Bujiloo
 CIP: 171881

THE GOVERNMENT OF PERU
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 EFECTIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO B.S. SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS - UNBSM
 Ing. Juan Pablo
 RESIDENTE DE OBRA

Id	Items	Nombre de tarea	Duración	Predecesor	Comienzo	Fin
26	01.01.02.03.05	SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA	30 días	25CC+2 días	vie 06/02/25	vie 07/03/25
27	01.01.02.04	CAPA RODADURA DE CICLOVIA REVESTIDA CON ADOQUIN DE CONCRETO	35 días	mié 22/01/25	mar 25/02/25	07/03
28	01.01.02.04.01	BASE GRANULAR E= 0.28 M	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25	25/02
29	01.01.02.04.02	PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE BASE	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	31/01
30	01.01.02.04.03	CAMA DE ARENA E=0.04 M	4 días	sáb 01/02/25	mar 04/02/25	04/02
31	01.01.02.04.04	REVESTIMIENTO DE PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO 0.10X0.20X0.06 (COLOR AZUL)	22 días	mar 04/02/25	mar 25/02/25	04/02
32	01.01.02.04.05	SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA	8 días	jue 06/02/25	jue 13/02/25	25/02
33	01.01.03	SARDINELES	47 días	mié 22/01/25	dom 09/03/25	09/03
34	01.01.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	47 días	mié 22/01/25	dom 09/03/25	09/03
35	01.01.03.03.01	ENCOFRADO Y DESECOFRADO DE SARDINEL	34 días	mié 22/01/25	lun 24/02/25	09/03
36	01.01.03.01.02	CONCRETO f _c =175 kg/cm ² EN SARDINELES	12 días	jue 13/02/25	lun 24/02/25	24/02
37	01.01.03.01.03	JUNTAS ASFALTICAS PARA SARDINELES	2 días	mar 25/02/25	mié 26/02/25	26/02
38	01.01.03.01.04	CURADO DE CONCRETO CON YUTE CRUDO	11 días	jue 27/02/25	dom 09/03/25	09/03
39	01.01.04	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	42 días	mié 22/01/25	mar 04/03/25	04/03
40	01.01.04.01.03	A DOQUIN DE CONCRETO	42 días	mié 22/01/25	mar 04/03/25	04/03
41	01.01.04.01.03.0	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR (E=20CM)	16 días	mié 22/01/25	jue 06/02/25	04/03
42	01.01.04.01.03.0	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA (E=5CM)	3 días	vie 07/02/25	dom 09/02/25	09/02
43	01.01.04.01.03.0	REVESTIMIENTO DE PISO CON ADOQUINES DE CONCRETO 0.10X0.20X0.04 COLOR ROJO	16 días	lun 10/02/25	mar 25/02/25	25/02
44	01.01.04.01.03.0	SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA	5 días	mié 26/02/25	dom 02/03/25	02/03
45	01.01.04.01.03.0	JUNTA LONGITUDINAL e=1"	2 días	lun 03/03/25	mar 04/03/25	04/03
46	01.01.07	DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	71 días	vie 07/02/25	vie 18/04/25	18/04
47	01.01.07.01	CANALETA LATERAL 0.50 X 0.50 M	71 días	vie 07/02/25	vie 18/04/25	18/04
48	01.01.07.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	71 días	vie 07/02/25	vie 18/04/25	18/04
49	01.01.07.01.02.0	EXCAVACION DE TERRENO PARA CANALETA MANUAL	42 días	vie 07/02/25	jue 20/03/25	20/03
50	01.01.07.01.02.0	PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CANALETA	6 días	vie 07/02/25	mié 12/02/25	12/02

PARALIZACIÓN DE OBRA DEL 01 DE ENERO HASTA 21 DE ENERO

Progreso manual

Sólo fin
 Fecha límite
 Tareas críticas
 División crítica
 Progreso

Tarea manual
 Solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual
 Solo el comienzo

Tareas externas
 Hito externo
 Tarea inactiva
 Hito inactivo
 Resumen inactivo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS UNMSU
 Ing. Rocky Escobar Bellido
 SUPERVISOR DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS UNMSU
 Ing. Julian Santa Pablo
 C.R. 76997



Tarea manual: Solo fin

Tarea externa: Tarea manual

División: Solo duración

Hito: Hito externo

Hito Inactivo: Tarea Inactiva

Resumen de hito: Resumen manual

Resumen de proyecto: Solo el comienzo

Progreso manual: Progreso manual

Fecha límite: Tareas críticas

División crítica: División crítica

Progreso: Progreso



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y ADMINISTRATIVOS UNSC


Ing. Rocky Escobar Bellido
CIP: 171897
SUPERVISOR DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y ADMINISTRATIVOS UNSC

Ing. Julián Jantá Pabío
CIP: 169387
SUPERVISOR DE OBRA

Id ítems	Nombre de tarea	Duración	Predicción	Comienzo	Fin
101_01.03.01.02.04	CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA PVC Ø 8" H=0.10M	4 días	100	lun 03/02/25	jue 06/02/25
102_01.03.01.03	RELLENO DE ZANJA	6 días		mié 26/02/25	lun 03/03/25
103_01.03.01.03.01	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDADO H=0.8 M	5 días	106	mié 26/02/25	dom 02/03/25
104_01.03.01.03.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	103	lun 03/03/25	lun 03/03/25
105_01.03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	19 días		vie 07/02/25	mar 25/02/25
106_01.03.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 8" NORMAL ISO 4436	19 días	101	vie 07/02/25	mar 25/02/25
107_01.03.02	CONSTRUCCION DE BUZONES	15 días		lun 03/02/25	lun 17/02/25
108_01.03.02.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	15 días		lun 03/02/25	lun 17/02/25
109_01.03.02.01.01	SOLADO DE E=4" PARA BUZONES MEZCLA C:H 1:12	1 día	99FC+1 día	lun 03/02/25	lun 03/02/25
110_01.03.02.01.02	DADOS DE CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 SALIDA - BUZON	1 día	109CC	lun 03/02/25	lun 03/02/25
111_01.03.02.01.03	MARCO Y TAPA DE F'f P. BUZON	1 día	117	lun 17/02/25	lun 17/02/25
112_01.03.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	8 días		lun 03/02/25	lun 10/02/25
113_01.03.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES	5 días	109CC+2 días	mié 05/02/25	dom 09/02/25
114_01.03.02.02.02	AGERO F'y=4200kgf/cm2	1 día	109CC	lun 03/02/25	lun 03/02/25
115_01.03.02.02.03	CONCRETO F'c=210 kgf/cm2 PIBUZON	1 día	113	lun 10/02/25	lun 10/02/25
116_01.03.02.03	REVOCQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	5 días		mié 12/02/25	dom 16/02/25
117_01.03.02.03.01	TARRAJEO, ACABADO EN MUROS Y LOSA SUPERIOR	5 días	115FC+1 día	mié 12/02/25	dom 16/02/25
118_01.04	ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, HIDRANTE CONTRA INCENDIOS Y RIEGO	89 días		mié 22/01/25	lun 21/04/25
119_01.04.01	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	32 días		mié 22/01/25	sáb 22/02/25
146_01.04.03	RIEGO	23 días		vie 31/01/25	sáb 22/02/25
147_01.04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	23 días		vie 31/01/25	sáb 22/02/25
148_01.04.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO	2 días	98CC	vie 31/01/25	sáb 01/02/25
149_01.04.03.02.02	PERFILADO Y NIVELADO DE FONDO DE ZANJA	4 días	100CC	sáb 01/02/25	mar 04/02/25
150_01.04.03.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10M	5 días	149	mié 05/02/25	dom 09/02/25
151_01.04.03.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO SOBRE CLAVE H=0.3M	10 días	155	mié 12/02/25	vie 21/02/25

PARALIZACIÓN DE OBRA DEL 01 DE ENERO HASTA 21 DE ENERO

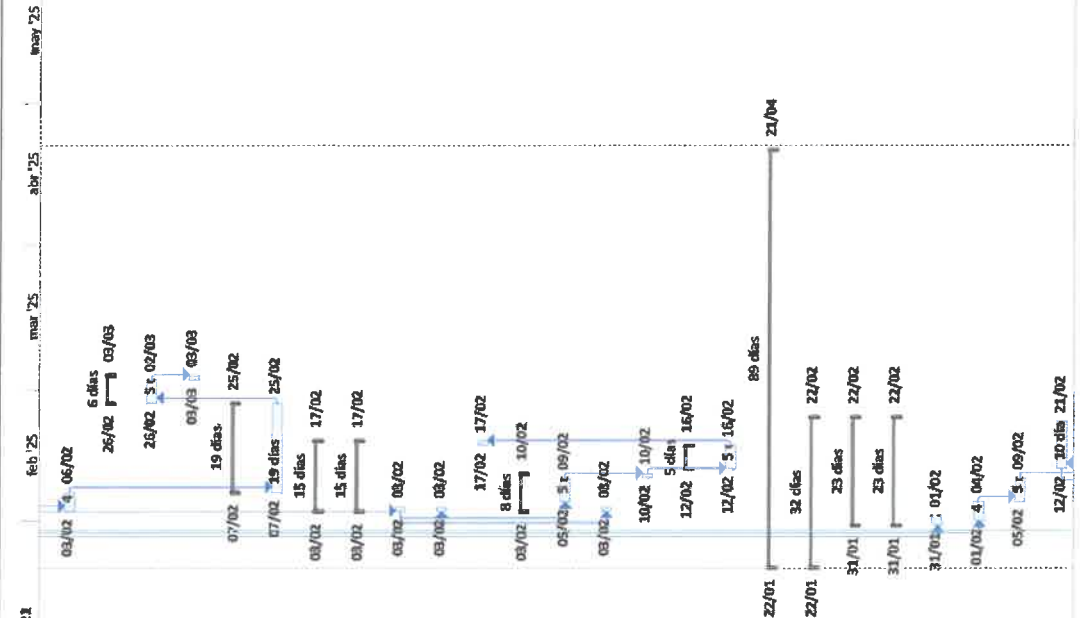

Tarea	División	Hito	Resumen	Resumen del proyecto
Tareas externas	Hito externo	Tareas Inactiva	Hito Inactivo	Resumen Inactivo
Tarea manual	Sólo duración	Informe de resumen manual	Resumen manual	Sólo el comienzo
Sólo fin	Fecha límite	Tareas críticas	División crítica	Progreso
				Progreso manual

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVIDOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS

Ing. Berly Escobar Bellido
CIP: 111881
SUPERVISOR DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVIDOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS

Ing. Julián Edita Pablo
CIP: 166567

id	Items	Nombre de tarea	Duración	Predectorio	Comienzo	Fin
152	01.04.03.02.05	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	10 días	151CC	mié 12/02/25	vie 21/02/25
153	01.04.03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	152	sáb 22/02/25	sáb 22/02/25
154	01.04.03.03	SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS	2 días		lun 10/02/25	mar 11/02/25
155	01.04.03.03.01	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 SAP C-10 Ø : 3"	2 días	150	lun 10/02/25	mar 11/02/25
156	01.04.03.03.05	ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION	1 día	155CC	lun 10/02/25	lun 10/02/25
157		FIN	0 días		lun 23/04/25	lun 21/04/25

PARAMIZACIÓN Y DE OBRAS DEL 01 DE FEBRERO HASTA 21 DE FEBRERO



21/04


 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS" UNISOCH
 Ing. Julian Tenia Pabio
 CIP: 169387
 RESIDENTE DE OBRA


 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS" UNISOCH
 Ing. Rocky Escober Bellido
 CIP: 171881
 SUPERVISOR DE OBRA



Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin	Progreso manual
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	División crítica	
Resumen de proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	Progreso	
